

Cập nhật tiến độ dự án phân khu Aqua Bay tháng 6/2016


Đến tháng 6/2016, cư dân của phân khu Aqua Bay đã nhìn thấy hình dáng một phân khu sôi động qua công tác thi công khẩn trương các biệt thự, nhà phố, căn hộ và sân golf.



1. Quần thể biệt thự ven hồ Marina Water Front

Công tác lắp đặt cốt pha thép dầm sàn đang được gấp rút tiến hành. Điển hình lô 81 đã hoàn thiện dầm sàn tầng mái, bắt đầu tiến hành xây tường tầng 1.

Hệ thống đường đi quanh nhà phố, biệt thự đang được thi công nền đường

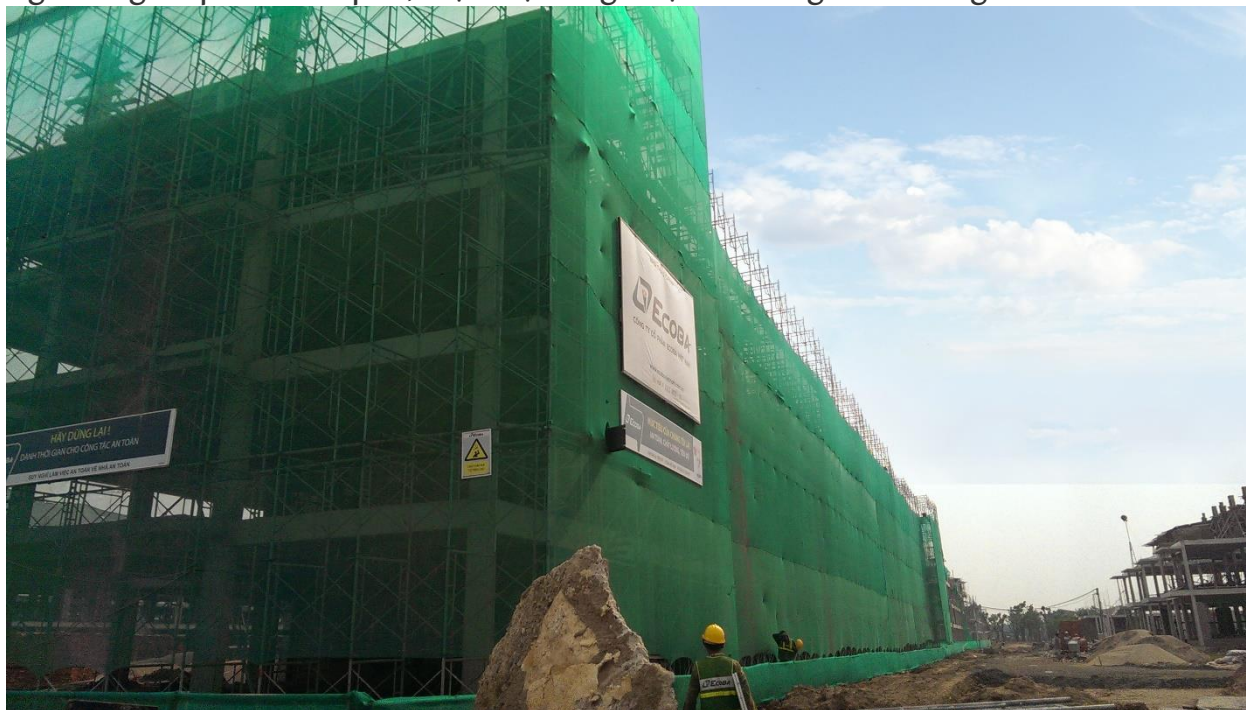

2. Biệt thự Minosa

Nhiều biệt thự đã hoàn thiện tường, tiến hành công tác hoàn thiện cầu thang các tầng bao gồm các căn: 15 -> 18, 52-> 55, 68-> 71, 80, 81, 89-> 91, 125A->128, 147-> 150, 155, 156, 159->163, 165A.

Các căn còn lại đang tiến hành công tác lắp cát đôn nền, thi công dầm sàn



3. Nhà phố thương mại Thảo Nguyên



Tất cả các căn đều đang tiến hành công tác thi công dầm sàn, đặc biệt có 100 căn đã xây tường tầng 3,4 bao gồm: căn 02-> 12, 15-> 21, 25-> 37, 40-> 43, 69-> 77, 89-> 93, 125-> 131, 138-> 141, 146-> 148, 118-> 121, 151-> 156, 161-> 168.

4. Nhà phố thương mại Thủy Nguyên



Các căn đang được tiến hành công tác dựng cốt pha, đổ dầm sàn các tầng. Đặc biệt có một số căn đang xây tường tầng 1.

5. Khu căn hộ hiện đại West Bay Sky Residences

Toàn bộ 4 tháp đã hoàn thiện phần móng, trong đó:

Tháp D: đang thi công, dự kiến đổ bê tông sàn tầng 4 trước 30/6/2016

Tháp C: chuẩn bị thi công kết cấu cột dầm sàn tầng 1, đang triển khai các công tác chuẩn bị bao gồm giáo an toàn quanh công trình, dọn dẹp tập kết vật tư.

Tháp B: đang thi công kết cấu cột dầm sàn tầng 1

Tháp A: chuẩn bị thi công kết cấu cột dầm sàn tầng 1, đang triển khai các công tác chuẩn bị: giáo an toàn quanh công trình, dọn dẹp tập kết vật tư.



Tổng thể khu căn hộ hiện đại West Bay Sky Residences

6. Học viện Golf EPGA



Đã hoàn thiện sơ bộ phần trát của cầu lạc bộ, đang tiến hành các công tác thi công điện, nước



Sân cỏ đang thực hiện công tác tạo hình hố và các đường golf
